Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1							
2		**HOLSBEEK - Konijnenberg**	110 dagen	maa 13/04/2	din 6/10/26		
3		**FASE 1 : Mereldreef**	**9 dagen**	**maa 13/04/2**	**don 23/04/2**		
4		Opbraak wegenis	1 dag	maa 13/04/2	maa 13/04/2		
5		Aanleg DWA riolering	3 dagen	din 14/04/26	don 16/04/2	4	
6		Wachtaansluitingen	3 dagen	vri 17/04/26	din 21/04/26	5	
7		Herstel verharding wegenis	2 dagen	woe 22/04/2	don 23/04/2	6	
8							
9		**Fase 2: Mereldreef**	**8 dagen**	**vri 24/04/26**	**woe 6/05/26**		
10		Opbraak wegenis	1 dag	vri 24/04/26	vri 24/04/26	7	
11		Aanleg DWA riolering	3 dagen	maa 27/04/2	woe 29/04/2	10	
12		Wachtaansluitingen	3 dagen	don 30/04/2	din 5/05/26	11	
13		Herstel verharding wegenis	1 dag	woe 6/05/26	woe 6/05/26	12	
14							
15		**Fase 3: Vinkendreef**	**4 dagen**	**don 7/05/26**	**din 12/05/26**		
16		Opbraak wegenis	1 dag	don 7/05/26	don 7/05/26	13	
17		Aanleg DWA riolering	1 dag	vri 8/05/26	vri 8/05/26	16	
18		Wachtaansluitingen	1 dag	maa 11/05/2	maa 11/05/2	17	
19		Herstel verharding wegenis	1 dag	din 12/05/26	din 12/05/26	18	
20							
21		**Fase4: Driedennekespad**	**9 dagen**	**woe 13/05/2**	**din 26/05/26**		
22		Opbraak wegenis	2 dagen	woe 13/05/2	don 14/05/2	19	
23		Aanleg DWA riolering	4 dagen	maa 18/05/2	don 21/05/2	22	
24		Wachtaansluitingen	2 dagen	vri 22/05/26	maa 25/05/2	23	
25		Herstel verharding wegenis	1 dag	din 26/05/26	din 26/05/26	24	
26							
27		**Fase 5: Attenhovendreef**	**50 dagen**	**woe 27/05/2**	**din 25/08/26**		
28		Opbraak wegenis	3 dagen	woe 27/05/2	vri 29/05/26	25	
29		Aanleg DWA riolering	8 dagen	maa 1/06/26	woe 10/06/2	28	
30		Wachtaansluitingen	8 dagen	don 11/06/2	maa 22/06/2	29	
31		Herstel verharding wegenis Steenslagverharding	4 dagen	din 23/06/26	vri 26/06/26	30	
32		Herstel verharding wegenis 2 sporenbeton	3 dagen	vri 21/08/26	din 25/08/26	46	
33							
34		Afwerking allerlei - plaatsing grachtelementen	5 dagen	maa 6/07/26	vri 10/07/26		
35							
36		**Fase 6: Zwaluwendreef**	**15 dagen**	**maa 29/06/2**	**vri 7/08/26**		
37		Opbraak wegenis	2 dagen	maa 29/06/2	din 30/06/26	31	
38		Aanleg DWA riolering	5 dagen	woe 1/07/26	din 7/07/26	37	
39		Wachtaansluitingen	5 dagen	woe 8/07/26	din 4/08/26	38	
40		Herstel verharding wegenis	3 dagen	woe 5/08/26	vri 7/08/26	39	
41							
42		**Fase 7: Meesberg**	**11 dagen**	**maa 10/08/2**	**maa 24/08/2**		
43		Opbraak wegenis	2 dagen	maa 10/08/2	din 11/08/26	40	
44		Aanleg DWA riolering	3 dagen	woe 12/08/2	vri 14/08/26	43	
45		Wachtaansluitingen	3 dagen	maa 17/08/2	woe 19/08/2	44	
46		Herstel verharding wegenis (fundering)	1 dag	don 20/08/2	don 20/08/2	45	
47		Herstel verharding wegenis 2 sporenbeton	2 dagen	vri 21/08/26	maa 24/08/2	46	
48							
49		**Fase 8: Konijntjesberg**	**21 dagen**	**vri 21/08/26**	**vri 18/09/26**		
50		Opbraak wegenis	2 dagen	vri 21/08/26	maa 24/08/2	46	
51		Aanleg DWA riolering	3 dagen	din 25/08/26	don 27/08/2	50	
52		Wachtaansluitingen	2 dagen	vri 28/08/26	maa 31/08/2	51	
53		Herstel verharding wegenis fundering + steenslagverharding	2 dagen	din 1/09/26	woe 2/09/26	52	
54		Herstel verharding wegenis Asfalt	2 dagen	don 17/09/2	vri 18/09/26		
55							
56		**Fase 9: Meesberg**	**22 dagen**	**don 3/09/26**	**vri 2/10/26**		
57		Opbraak wegenis	1 dag	don 3/09/26	don 3/09/26	53	
58		Aanleg DWA riolering	3 dagen	vri 4/09/26	din 8/09/26	57	
59		Wachtaansluitingen	3 dagen	woe 9/09/26	vri 11/09/26	58	
60		Herstel verharding wegenis fundering + steenslagverharding	2 dagen	maa 14/09/2	din 15/09/26	59	
61		Herstel verharding wegenis 2 sporenbeton	5 dagen	maa 28/09/2	vri 2/10/26		
62							
63		**Fase 10: Meesberg**	**15 dagen**	**woe 16/09/2**	**din 6/10/26**		
64		Opbraak wegenis	2 dagen	woe 16/09/2	don 17/09/2	60	
65		Aanleg DWA riolering	4 dagen	vri 18/09/26	woe 23/09/2	64	
66		Wachtaansluitingen	3 dagen	don 24/09/2	maa 28/09/2	65	
67		Herstel verharding wegenis fundering + steenslagverharding	2 dagen	din 29/09/26	woe 30/09/2	66	
68		Herstel verharding wegenis 2 sporenbeton	3 dagen	don 1/10/26	maa 5/10/26		
69							
70		Afwerking allerlei - plaatsing grachtelementen	10 dagen	woe 23/09/2	din 6/10/26		
71							
72		**PERSING**	14 dagen	maa 4/05/26	vri 22/05/26		

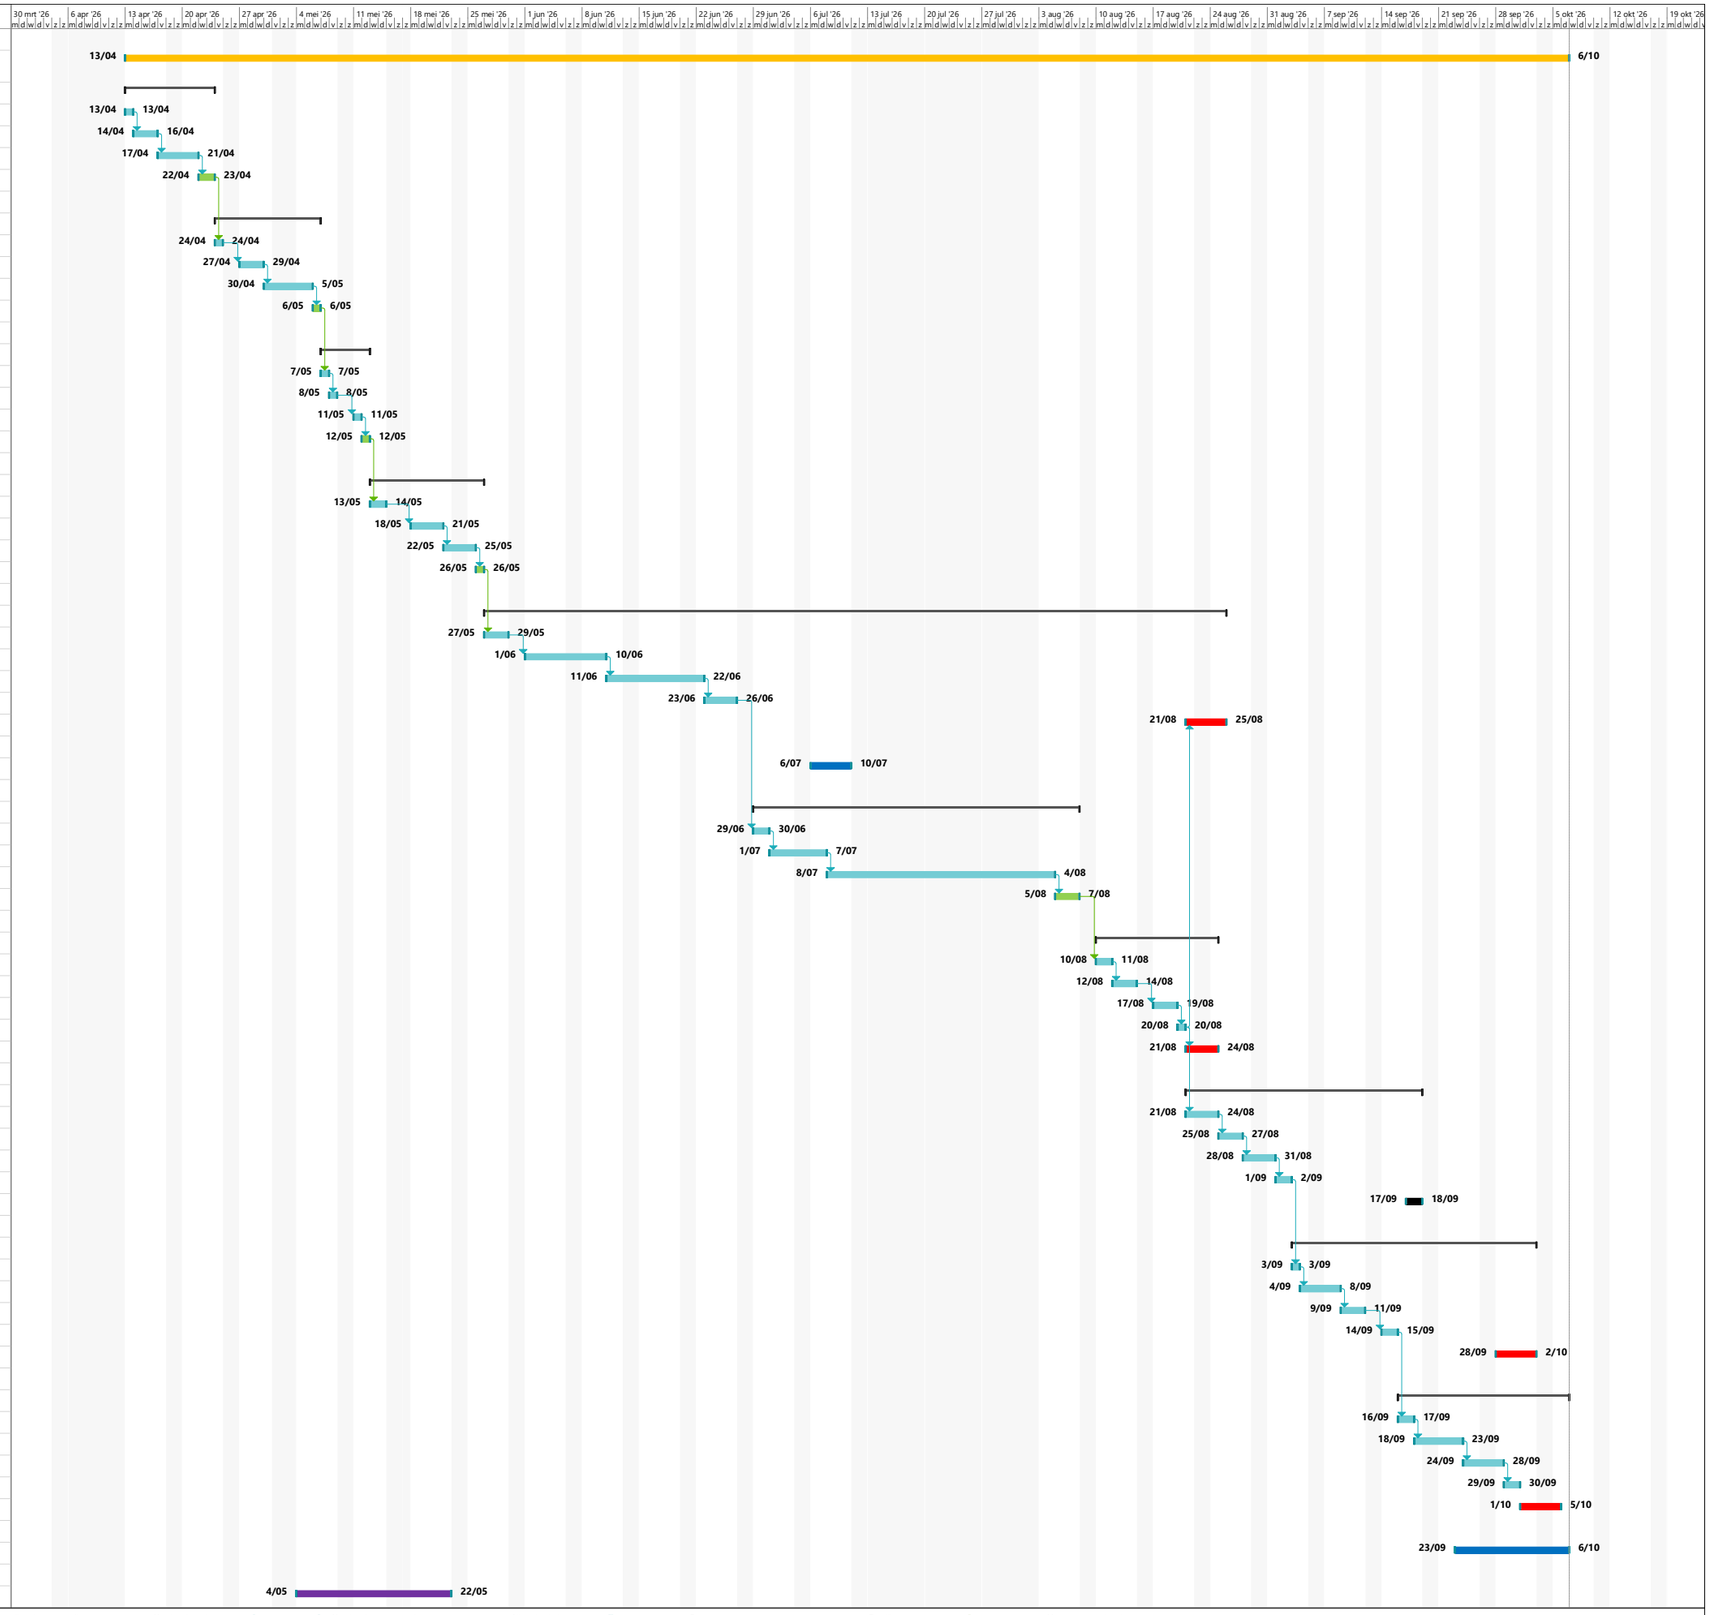

Project: HOLSBEEK-Planning-Ko
Datum: woe 21/01/26

Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Inactieve mijlpaal | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Externe taken | Deadline | Voortgang, handmatig
Splitsing | Samenvatting | Inactieve taken | Inactieve samenvatting | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | Externe mijlpaal | Voortgang
